



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL**

CODIGO: D101PR01F21
FECHA: 2024-04-29
VERSIÓN: 04

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Y PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (PAI) 2024																
ITEM	Área Responsable	Pliegos del Gobierno	Transformación de Políticas y Programas del PND	Objetivos Estratégicos	AVANCE DE GESTIÓN					SEGUIMIENTOS								
					Estrategia (Programa Estratégico - GIMA)	Iniciativa	Indicador Programático	Resultados trimestrales meta			Reporte GIMA Corte 30-06-2024	Análisis / Recomendación (Reportado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional)		Análisis del Reporte 2do Trimestre de 2024				
						Meta Programática 2024	Meta T2	Resultado T2	Avance de meta Programa	Avance de meta Programa 2024	Análisis de la Oficina de Control Interno		Fórmula para análisis	Comentarios OAPII				
1	Líder: Despacho del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad Viceministerio de Talento y Aprovechamiento del Conocimiento Direcciones Técnicas	I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz Total	Eje Transformaciones: 1. Ordenamiento del territorio 2. Seguridad humana 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática 5. Convergencia Regional Ejes Transversales: 1. Actores Diferenciales para el Cambio 2. Paz Total Integral	Adoptar enfoques de diseño y evaluación de políticas, planes y programas de CTEI. Fortalecer la gobernanza del SNTCI y sus capacidades a través de políticas públicas, planes y programas de CTEI.	(PE1) Ordenar el SNTCI mediante el diseño y evaluación de Políticas públicas en CTEI, la gestión de la gobernanza y del marco regulatorio del sector	Agenda de políticas y Plan de Evaluación de Políticas, planes y programas de CTEI desarrollados	100%	20%	20%	20%	20%	20%	De acuerdo con los avances reportados para el segundo trimestre, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional evidencia un avance adecuado en la gestión y resultados de la iniciativa correspondiente.	100,0%	Indicador presenta avance esperado			
					Informe anual consolidado sobre el diseño y/o implementación de programas, instrumentos y mecanismos en el marco de las hojas de ruta de las FIDIM	1	0	0%	0%	0%	El reporte realizado por el área responsable refleja un avance oportuno en la gestión para la consolidación del informe anual sobre el diseño y/o implementación de los mecanismos en el marco de las hojas de ruta de las FIDIM.	100,0%	Indicador presenta avance esperado					
					Recopilación y análisis de información de avance en el desarrollo de las iniciativas normativas para fortalecer las capacidades de CTEI.	100%	40%	0%	0%	0%	La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional identifica que el reporte realizado por el área responsable refleja cuantos de botella para el avance en el desarrollo de las actividades planteadas en el cronograma inicial de la iniciativa, razón por la cual, se evidencia la necesidad de realizar mesas de trabajo con las direcciones responsables de los insumos para definir las estrategias y ajustes que sean pertinentes para el cumplimiento de la meta final.	0,0%	Indicador presenta avance esperado					
					Avance en la implementación de los artículos de CTEI del PND 2023-2026	100%	63%	56,88%	57%	57%	El proceso de implementación de los artículos de CTEI del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 presenta un avance con una desviación menor respecto a la meta planeada para el segundo trimestre. Se recomienda mejorar el trabajo articulado y de ser necesario realizar oportunamente las alertas correspondientes respecto al trabajo de implementación o implementación de cada uno de los artículos del PND incluidos en la meta.	56,88%	Indicador presenta avance esperado					
2	Líder: Dirección de Recursos de la CTEI Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad Viceministerio de Talento y Aprovechamiento del Conocimiento Secretaría Técnica del OCAD	I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz Total	Eje Transformaciones: 1. Ordenamiento del territorio 2. Seguridad humana 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática 5. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6. Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total Integral	Gestionar recursos para el SNTCI Gestionar de la Secretaría Técnica del OCAD de la CTEI del SGA	(PE2) Gestionar la financiación del SNTCI	Participación de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) frente al PIB	0,39%	No aplica	No aplica	0,00%	0%	No aplica	Teniendo en cuenta que la periodicidad del indicador y la meta anual no se tienen comunicados para este periodo de reporte.	No aplica	Si bien es cierto en la actualidad se tiene definido un reporte para este indicador en la vigencia 2024, se considerará generar una oportunidad de mejora de forma que para las próximas programaciones de indicadores anales se genere un reporte de avance descriptivo de la gestión realizada trimestralmente.			
					Recursos gestionados para el SNTCI	125.000	0	0	0	0%	El área realiza el reporte oportunamente y respecto al trimestre anterior amplía la información referente a las estrategias desarrolladas para la gestión de recursos que aportan al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.	100,0%	Indicador presenta avance esperado					
					Porcentaje de proyectos radicados en la Secretaría Técnica y presentados al OCAD para su financiación.	100%	30%	0%	0%	0%	De acuerdo con el reporte realizado por la Secretaría Técnica del OCAD de CTEI del SGA, no se evidencian el cumplimiento adecuado de la meta programada para el segundo trimestre, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda adelantar las gestiones pertinentes con el OCAD para asegurar la presentación de los proyectos pendientes en el siguiente trimestre.	0	Indicador presenta avance esperado					
						100%	30%	0%	0%	0%	El reporte refiere que para este periodo, no se radicaron proyectos en la Secretaría Técnica para la revisión de cumplimiento de los requisitos de validación del SGR y su presentación al OCAD para viabilización, priorización y aprobación.	0,0%	Indicador presenta avance esperado					
3	Líder: Dirección de Vocaciones y Formación Corresponsable: Dirección de Gestión de Recursos de la CTEI	I. Justicia Social II. Justicia Ambiental	Eje Transformaciones: 1. Ordenamiento del territorio 2. Seguridad humana 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática 5. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6. Actores Diferenciales para el Cambio	Fortalecer la gobernanza del SNTCI y sus capacidades a través de políticas públicas, planes y programas de CTEI. Reducir las brechas territoriales, diferenciadas y participativas en el bienestar social	(PE3) Incrementar las vocaciones científicas en la población infantil y juvenil, la formación de alto nivel en CTEI, y el fomento a la vinculación del capital humano en el SNTCI; para contribuir a la sostenibilidad ambiental, económica y al bienestar social	Campeonatos STEM desarrollados	4	0	0	0	0%	0	En línea con los avances reportados en la iniciativa "Columba Robótica 2024", la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda al área responsable solicitar los ajustes a la planeación que se consideren necesarios, de acuerdo con la reestructuración que se menciona para la iniciativa, esto para asegurar que las tareas, indicadores y metas asociadas reflejen efectivamente el enfoque de la iniciativa.	100,0%	Indicador presenta avance esperado			
					Niños, niñas y adolescentes	1.200	0	0	0	0%	0	0	0%	0	El reporte no detalla el avance de los siete (7) indicadores que integran la iniciativa	100,0%	Indicador presenta avance esperado	
					Laboratorios dotados para el desarrollo de proyectos de innovación	7	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Proyectos de innovación	6	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Tecnólogos en conflicto, Transmisión de conocimientos	1	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Programas y proyectos de CTEI	1	0	0,00%	0,00%	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Programas y proyectos de CTEI	119	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Programas y proyectos de CTEI	119	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Programas y proyectos de CTEI	119	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Programas y proyectos de CTEI	119	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Programas y proyectos de CTEI	11	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					Programas y proyectos de CTEI	10	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	Después del reporte en CINE del segundo trimestre de 2024, documento de memoria general que la convocatoria ha tenido una adherencia, sin embargo el indicador se programó de manera adecuada ya que aunque tuvo un haber adherido, no afecta en la meta propuesta.	100,0%	Indicador presenta avance esperado

Líder: Dirección de Vocaciones y Formación Corresponsable: Dirección de Gestión de Recursos de la CTet Secretaría Técnica del OCAD	7. Paz Total e Integral				<p>Niños, niñas y adolescentes apoyados en su vocación científica - Programa ONDAS en los Trimestres 2023-2024</p> <p>6.000 1.500 1.501 1.501 25%</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional evidencia que el reporte se realiza con el suficiente detalle que permite conocer el avance de la iniciativa. Sin embargo, se recomienda identificar las posibles situaciones que impliquen riesgos para el cumplimiento de las metas y solicitar oportunamente los ajustes correspondientes.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, demuestra avances en el desarrollo del programa Ondas. Las actividades detalladas reflejan avance en el cumplimiento de los indicadores establecidos.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 1500 y se evidencia un cumplimiento superior a la meta de 1501. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	100,1%	Indicador presenta avance esperado
					<p>Niños, niñas y adolescentes apoyados en su vocación científica - Convocatoria SGR Round 21-22</p> <p>7.000 0 0 0 0%</p>	<p>El Segundo trimestre de la iniciativa "Centros de Interés en CTet" muestra un avance en la identificación de alternativas que permitan lograr el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta la resolución 0036 del 21 de marzo de 2024, que declara desierta la convocatoria 947 de 2023. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda solicitar los ajustes a la planeación que correspondan a las alternativas identificadas para el cumplimiento de las metas.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, demuestra avances en el desarrollo del programa Ondas según el plan anual. Las actividades descritas proyectan el cumplimiento del indicador según la meta.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					<p>Niños, niñas y adolescentes apoyados en su vocación científica - Centros de Interés en CTet en el marco de la formación integral y la resignificación del tiempo escolar.</p> <p>5.000 0 0 0 0%</p>	<p>El Segundo trimestre de la iniciativa "Centros de Interés en CTet" muestra un avance en la identificación de alternativas que permitan lograr el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta la resolución 0036 del 21 de marzo de 2024, que declara desierta la convocatoria 947 de 2023. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda solicitar los ajustes a la planeación que correspondan a las alternativas identificadas para el cumplimiento de las metas.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, refleja que se declara desierta la Convocatoria 947 de 2023 de acuerdo con la resolución mencionada.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					<p>Nuevas estancias posdoctorales apoyadas por MinCiencias y aliados - Centros de Interés en CTet</p> <p>12 0 0 0 0%</p>	<p>El Segundo trimestre de la iniciativa "Centros de Interés en CTet" muestra un avance en la identificación de alternativas que permitan lograr el cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta la resolución 0036 del 21 de marzo de 2024, que declara desierta la convocatoria 947 de 2023. La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda solicitar los ajustes a la planeación que correspondan a las alternativas identificadas para el cumplimiento de las metas.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, refleja que se declara desierta la Convocatoria 947 de 2023 de acuerdo con la resolución mencionada.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					<p>Jóvenes Investigadores e Innovadores apoyados en su vocación científica - Aliados (ANI e IGAC)</p> <p>139 19 19 19 14%</p>	<p>La iniciativa "Jóvenes Investigadores e Innovadores" alcanzó un cumplimiento adecuado en el segundo trimestre de acuerdo con la programación de sus metas. Se recomienda mantener el trabajo articulado y de ser necesario realizar oportunamente las alertas correspondientes respecto al mecanismo asociado con el ANI.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024 evidencia un cumplimiento del indicador adecuado desde el anterior trimestre ya que no cambia y ha mostrado el financiamiento de propuestas elegibles, la vinculación de jóvenes y el total de las propuestas elegibles y financiadas. Ha reflejado la articulación con la Agencia Nacional de Investigación en la convocatoria.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 19 y se evidencia un cumplimiento de la meta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	100,0%	Indicador presenta avance esperado
					<p>Persona seleccionadas para recibir apoyo económico por MinCiencias y aliados para su formación en programas de maestría - Colfuturo</p> <p>852 852 1.800 1.800 100%</p>	<p>En el segundo trimestre de 2024 se evidencia un cumplimiento superior al planeado para las estrategias desarrolladas con Colfuturo, por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda al área realizar oportunamente las solicitudes de ajuste a la planeación de tal manera que se refleje adecuadamente los esfuerzos del Ministerio. Se recomienda mantener el trabajo articulado y de ser necesario realizar oportunamente las alertas correspondientes respecto al impacto de las metas o cambios en los mecanismos que aporta a estos indicadores y metas. En este sentido, se eleva una alerta sobre la pertinencia de reprogramar la meta asociada a la convocatoria de SGR en tanto los cronogramas del OCAD pueden afectar su cumplimiento en el 2024 ya que no se menciona en el reporte y la meta propuesta para el cuarto trimestre aumenta considerablemente.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, muestra que se cumple la meta anual hasta el cuarto trimestre de 2024.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 852 y se evidencia un cumplimiento superior a la meta que incluye alcanza a cubrir los dos trimestres siguientes. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	211,7%	Indicador presenta avance esperado
					<p>Persona seleccionadas para recibir apoyo económico por MinCiencias y aliados para su formación en programas de doctorado - Aliados (Colfuturo, Fulbright) SGR</p> <p>1.150 150 216 216 18%</p>	<p>En el segundo trimestre de 2024 se evidencia un cumplimiento superior al planeado para las estrategias desarrolladas con Colfuturo, por lo cual, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda al área realizar oportunamente las solicitudes de ajuste a la planeación de tal manera que se refleje adecuadamente los esfuerzos del Ministerio. Se recomienda mantener el trabajo articulado y de ser necesario realizar oportunamente las alertas correspondientes respecto al impacto de las metas o cambios en los mecanismos que aporta a estos indicadores y metas. En este sentido, se eleva una alerta sobre la pertinencia de reprogramar la meta asociada a la convocatoria de SGR en tanto los cronogramas del OCAD pueden afectar su cumplimiento en el 2024.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, muestra avances en la convocatoria Colfuturo, pero la OAPI eleva una alerta sobre la pertinencia de reprogramar la meta asociada a la convocatoria del SGR en tanto los cronogramas del OCAD pueden afectar su cumplimiento en el 2024 ya que no se menciona en el reporte y la meta propuesta para el cuarto trimestre aumenta considerablemente.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 150 y se evidencia un cumplimiento superior a la meta que inclusive alcanza a cubrir los dos meses siguientes. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de 100%.</p>	144,0%	Indicador presenta avance esperado
					<p>Nuevas estancias posdoctorales apoyadas por MinCiencias y aliados - Banco adicional financierable convocatoria 934 2023</p> <p>41 41 46 46 100%</p>	<p>Respecto a la convocatoria de SGR en tanto los cronogramas del OCAD pueden afectar su cumplimiento en el 2024 ya que no se menciona en el reporte y la meta propuesta para el cuarto trimestre aumenta considerablemente.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, muestra que se cumple la meta anual hasta el cuarto trimestre de 2024.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 41 y se evidencia un cumplimiento superior a la meta de 46. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de 100%.</p>	112,2%	Indicador presenta avance esperado
					<p>Plataforma SciENTI (CVLac, GINLac e Institutos) actualizada para su integración con el Sistema CRIS Colombia</p> <p>100% No aplica No aplica No aplica No aplica</p>	<p>Respecto a la iniciativa de modernización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) se realiza la recomendación de definir y/o reestructurar los indicadores así como la planificación de las tareas para los siguientes periodos de reporte que permitan dar cuenta de los resultados de la iniciativa. De igual forma se observa la necesidad de realizar una mesa de trabajo que permita identificar las alternativas para reflejar adecuadamente la gestión y planeación de la iniciativa.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, no describe cómo la iniciativa "Modernización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)" se alinea con las actividades que dan cuenta los indicadores: "Plataforma SciENTI (CVLac, GINLac e Institutos)" actualizado para su integración con el Sistema CRIS Colombia" y "Protocolos de ética consolidados para divulgación y publicación de resultados de investigación". De forma general se reportan acciones como: Comunicación del Proyecto a la Ciudadanía, la presentación del Modelo de Modernización, soportado en el contrato de administración de proyectos N° 174 del 2023, Plan de Trabajo del Operador Contratado.</p> <p>Análisis: El reporte refiere suspensión oficial de la administración de proyectos el 5 de marzo de 2024 por instrucciones de los directivos del Ministerio y no permite identificar acciones para la suspensión de continuidad del proyecto de modernización. No refleja si la suspensión afecta acciones como la implementación del Sistema CRIS y la actualización de SciENTI las cuales se verán interrumpidas. Tampoco identifica si la interrupción de las medidas clave podría llevar a un incumplimiento de los objetivos específicos del proyecto.</p>	No aplica	Finalizando el segundo trimestre, la Dirección de Ciencia presentaba dificultades en la definición y estructuración de este indicador, de acuerdo con esto, desde la OAPI se llevaron a cabo mesas de trabajo con el fin de retener la importancia de mantener actualizada la información soporte de la planeación, particularmente el Plan de Acción Institucional; de igual forma, se plantea la necesidad de generar una mesa de trabajo con la Dirección de Ciencia y el equipo de fortalecimiento Organizacional y de Planeación y Gestión de la OAPI, con el fin de generar las oportunidades de mejora que resulten de este ejercicio.
					<p>Protocolos de ética consolidados para divulgación y publicación de resultados de investigación.</p> <p>5 No aplica No aplica No aplica No aplica</p>	<p>Respecto a la iniciativa de modernización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) se realiza la recomendación de definir y/o reestructurar los indicadores así como la planificación de las tareas para los siguientes periodos de reporte que permitan dar cuenta de los resultados de la iniciativa. De igual forma se observa la necesidad de realizar una mesa de trabajo que permita identificar las alternativas para reflejar adecuadamente la gestión y planeación de la iniciativa.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, muestra que se cumple la meta anual hasta el cuarto trimestre de 2024.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 41 y se evidencia un cumplimiento superior a la meta de 46. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de 100%.</p>	112,2%	Indicador presenta avance esperado

	<p>Líder: Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad</p> <p>Corresponsable: Dirección de Ciencia y Dirección de Recursos de CTI</p>	<p>Diferenciales para el Cambio 7. Na Total e Integral</p>	<p>Innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país</p>	<p>Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de políticas públicas, planes y programas de CTI</p>	<p>Soberanía Sanitaria</p>	<p>Proyectos de I+D+i apoyados para el desarrollo de biológicos, biotecnológicos, medicamentos, dispositivos, insumos, sistemas y servicios de atención en salud, tecnologías avanzadas y otras tecnologías en salud</p>	<p>10</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>30%</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional evidencia un cumplimiento adecuado de la gestión y metas de la iniciativa en el periodo reportado. Se recomienda mantener el trabajo articulado y de ser necesario realizar oportunamente las alertas correspondientes.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, muestra actividades de aprobación y ejecución de mecanismos de ejecución de recursos del FIS. También reporta la contratación directa de VECD, junto con la mesa y comitè realizados con la DGR. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 1 y se evidencia un cumplimiento de la meta de 3. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de 100%.</p>	<p>300,0%</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>
					Programa de Ciencias Básicas	Nuevos proyectos de I+D+i financiados a través de la convocatoria Investigación fundamental 937-2023	6	6	6	6	100%	De acuerdo con los avances reportados para el segundo trimestre, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional evidencia un avance adecuado en la gestión y resultados de la iniciativa correspondiente. Se recomienda mantener el trabajo articulado y solicitar el ajuste a la planeación que permita reflejar adecuadamente la gestión de la convocatoria 937 de 2023.	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, muestra que se cumplió la meta anual hasta el cuarto trimestre de 2024 y muestra que una vez se priorizaron los (6) propuestas del banco de financiables de la Convocatoria 937 de 2023 de Investigación fundamental, se notificó mediante correo electrónico a los investigadores principales de la entidades ejecutoras con el propósito de iniciar los trámites contractuales para cada una de las propuestas. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 6 y se evidencia un cumplimiento de la meta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de 100%.</p>	<p>100,0%</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>
5	<p>Líder: Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación - Dirección de Ciencia</p> <p>Corresponsable: Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad</p>	<p>I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica</p> <p>1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 2. Seguridad humana y justicia social 3. Derecho humano a la alimentación 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática 5. Convergencia Regional</p> <p>Ejes Transversales: 6. Actores Diferenciales para el Cambio 7. Na Total e Integral</p>	<p>Adoptar enfoques de políticas públicas para la investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país</p> <p>Fortalecer la gobernanza del SNCTI y sus capacidades a través de políticas públicas, planes y programas de CTI</p>	<p>(PES) Mejorar las capacidades para la transferencia de conocimiento y tecnología, con el fin de incrementar los niveles de productividad del país aportando a la reindustrialización en los retos prioritarios</p>	<p>Alzanas apoyadas para el desarrollo de tecnologías en IA para la solución de problemáticas regionales en el país</p> <p>Personas seleccionadas para recibir jóvenes investigadores e innovadores a través de la convocatoria científica</p> <p>Nuevas estancias postdoctorales en tecnologías basadas en I+D financiadas con procesos de uso y apropiación social para la solución de problemáticas de País, desastres naturales y cambio climático, con el uso de la IA y las estrategias desarrolladas para el uso y apropiación de soluciones basadas en IA</p> <p>Encuentros regionales realizados para la divulgación del conocimiento aerospacial</p> <p>Territorios en conflicto, transición y/o consolidación con acciones Programas y proyectos de CTI apoyados, orientados a las Alzanas apoyadas para el aprovechamiento del Programa de diálogo de saberes gestionado para el intercambio de los resultados de la expedición científica con los comités de los actores de la caduñña helice</p> <p>Productos pesqueros desarrollados a través de la I+D+i y validados a escala precomercial</p> <p>Estrategia de apropiación social del conocimiento desarrollado para la creación de redes del sector pesquero de Tumbaco</p> <p>Alianza apoyada para la escalabilidad de la etapa comercial de los productos</p> <p>Territorios en conflicto, transición y/o consolidación con acciones Programas y proyectos de CTI apoyados, orientados a las Alzanas apoyadas para el aprovechamiento del Programa de diálogo de saberes gestionado para el intercambio de los resultados de la expedición científica con los comités de los actores de la caduñña helice</p> <p>Territorios en conflicto, transición y/o consolidación con acciones Programas y proyectos de CTI apoyados, orientados a las Alzanas apoyadas para el aprovechamiento del Programa de diálogo de saberes gestionado para el intercambio de los resultados de la expedición científica con los comités de los actores de la caduñña helice</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>En el Segundo trimestre la iniciativa de "Ciudad Inteligente", avanzó con la gestión de la convocatoria 950 de 2023, no obstante, no se alcanzó el cumplimiento adecuado de las metas planteadas, esto derivado de la ausencia actual el cronograma y la publicación de los financiables. En línea con lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional recomienda para el tercer trimestre adelantar las acciones que permitan subsanar los retrasos y asegurar el cumplimiento de las metas.</p>	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, refleja que se ejecutó la convocatoria 950-2024 Ciudad Inteligente y se encuentra en la etapa de contratación. Se programó el Encuentro de Investigación fundamental, tecnologías aerospaciales y participación remoto. El 8 de julio de 2024 en el Hotel Hilton Curfuros, Bogotá D. C. Se espera reportar en el cuarto trimestre de los actores. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -Aunque 6 indicadores tienen meta propuesta de 0, se evidencian 4 indicadores con meta propuesta y ninguno de estos 4 indicadores alcanzan la meta propuesta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de 100% para 6 indicadores cuya meta es 0 y de 0% para 4 indicadores.</p>	<p>0,0%</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>	
					Programa Colombia Inteligente		3	3	3	3	100%	El reporte sobre nuevas estancias postdoctorales menciona reportar el indicador para el tercer semestre de 2024. Evaluación: Informe de 3 indicadores en 0. Este rezago implica un riesgo de incumplimiento. La OAPI genera recomendaciones de trabajo articulado y generación de alertas que deben ser atendidas. Si es necesario, se deben realizar mesas de trabajo ya que no se reportaron cuantitativamente ninguno de estos 10 indicadores. Las recomendaciones de la OAPI son coherentes.	<p>0,0%</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>	
					Programa Pacifico Vital		1	1	1	1	100%	En línea con lo reportado por el área responsable, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional identifica la necesidad de sustituir la iniciativa Pacifico Vital, considerando la proyección que reportará su ejecución para próximas mesas. Por lo tanto, la Oficina recomienda al Área responsable gestionar las solicitudes pertinentes para actualizar la planeación, asegurando así el cumplimiento de los aportes previstos para el avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, señala que el Programa Pacifico Vital (enfocado en la transformación de subproductos de la pesca a través de procesos de I+D+i) para generar productos pesqueros con valor agregado que refiera la participación de más de 500 personas y diversos actores del Sistema Nacional de Pesca, Tecnología e Innovación y articulación del Equipo de Trabajo conformado por el Despacho de la Ministra, Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad, y la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación, ha sido postergado y su recurso asignado a uno de los componentes del Programa, a través de la Convocatoria para la formación de maestrías de investigación científica del Pacifico Narifensa.</p>	<p>No aplica</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>
					Soberanía alimentaria y derecho a la alimentación		39	0	0	0	0%	El reporte realizado por los responsables refleja la gestión realizada en el segundo trimestre, avanzando en las actividades que permitan el cumplimiento de la meta anual. Se recomienda proporcionar información más detallada sobre las actividades para el cumplimiento de las tareas establecidas.	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, señala el avance en la contratación de proyectos elegibles y financiables de la convocatoria 943 en la que se tienen 45 proyectos elegibles y financiables, de las cuales 37 suscribieron contrato en el primer semestre del año 2024 e iniciaron su ejecución. Por otro lado, la apertura de la convocatoria 2024 (convencio 640-2023) de la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DDTI) en conjunto con el SENA se realizó en el tercer trimestre y ha sido aprobado por la OAPI. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	<p>100,0%</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>
					Jóvenes ciencia para la paz		50	0	0	0	0%	Durante el segundo trimestre el Programa Jóvenes Ciencia para la Paz reporta los avances en las convocatorias en los municipios de Quibdó, Buenaventura, Tumaño y el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, muestra para el Programa Jóvenes Ciencia para la Paz, la ejecución de las convocatorias en los capítulos: Buenaventura, Quibdó y Tumaño, reportando 50 iniciativas seleccionadas cumpliendo con la meta anual. En el capítulo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con la convocatoria actualmente se está llevando a cabo el proceso de evaluación de las 70 postulaciones. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	<p>100,0%</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>
					Jóvenes ciencia para la paz		50	0	0	0	0%	Se recomienda realizar un seguimiento continuo de los proyectos seleccionados, especialmente en términos de contribución a la paz y desarrollo local.	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, muestra el avance en la ejecución de los proyectos seleccionados, especialmente en términos de contribución a la paz y desarrollo local. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p>	<p>100,0%</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>
					Beneficios Tributarios		140	0	0	0	0%	El Programa de Beneficios Tributarios presenta avances que responden a la gestión planeada. Se recomienda mantener el trabajo articulado entre las áreas de gestión de los beneficios tributarios como son el CNBT y CNFIS, y de ser necesario realizar oportunamente las alertas correspondientes.	<p>Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, refleja que no se reportaron empresas beneficiadas con cupo por inversión en crédito fiscal y descuento durante este periodo. Se proyecta apertura de la convocatoria para el 2do semestre del año y medir el número de empresas que ejecutan proyectos de investigación y desarrollo que son beneficiados por el cupo de inversión (Crédito fiscal y descuento) en la vigencia fiscal. Reportos también que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CNBT) está realizando seguimiento y apoyo a la realización de impactos y sus evaluaciones solicitadas por el Consejo Superior de Política Fiscal -CNFIS para la aprobación del cupo de la vigencia 2024.</p>	<p>100,0%</p>	<p>Indicador presenta avance esperado</p>

	Líder: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI Corresponsables: Direcciones técnicas.			Plan marco de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto - Estrategia CTeI para el desarrollo rural	Proyectos de Investigación para el sector agropecuario en marcha	80	0	0	0	0%	El reporte relacionado con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto - Estrategia CTeI para el Desarrollo Rural, evidencia un avance en las gestiones para el cumplimiento de las metas asociadas. No obstante, de acuerdo con el reporte de la convocatoria 32 del SGR se genera una alerta dado la menor cantidad de proyectos que pasaron por etapas de verificación de requisitos	Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, señala que la convocatoria SENALIMVA 2024 se abrió en el tercer trimestre de 2024, en el segundo trimestre se realizaron convocatorias para adiciones de recurso. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento 100% para el segundo trimestre de 2024. La CAFTI genera recomendaciones de generación de alerta en cuanto a la convocatoria 32	100,0%	Indicador presenta avance esperado	
	Líder: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI Corresponsables: Viceministerio de Talento y Aprovechamiento del Conocimiento, Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI		Transición energética	Proyectos de CTeI apoyados para la Transición energética, acceso y uso eficiente de la energía	6		0	0	0%	0	En el segundo trimestre del 2024, la Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúa con la implementación de mecanismos para promover la financiación de proyectos de investigación, desarrollo científico e innovación en transición energética, con el objetivo de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento 100% para el segundo trimestre de 2024. La DGR reporta el adelanto de Convocatorias como mecanismos asociados a proyectos de investigación, desarrollo científico e innovación en transición energética, con el objetivo de garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.	100,0%	Indicador presenta avance esperado		
6	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI	II. Justicia Social	Ejes Transversales: 1. Ordenamiento del territorio 2. Seguridad humana y justicia social 3. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6. Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral	Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI	(PE6) Mejorar la comunicación pública y divulgación de la CTeI, para promover proyectos, estrategias comunicativas, pedagógicas y divulgativa de alto impacto, con el objetivo de incentivar, estimular, promover modelos abiertos y participativos de CTeI.	Adecuación de programas o iniciativas con el enfoque diferencial - Mesa de Concertación Indígenas	100%	30%	30%	30%	30%	A partir del seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - CAFTI se evidencia que el Área responsable cumple con el establecido respecto al indicador y tareas para el segundo trimestre de la vigencia 2024. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 30% y se evidencia un cumplimiento de la meta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento 100% para el segundo trimestre de 2024. De acuerdo con el diseño y la elaboración de una propuesta de términos de referencia para la convocatoria indígena, se encuentra en revisión por medio de mesas de trabajo que se realizaron entre las meses de mayo y agosto de 2024.	100,0%	Indicador presenta avance esperado	
	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI			Proyectos de CTeI dirigidos a consensos comunarios, organizaciones y otras formas organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Ralizes y Palenqueras.	Avance en la implementación de los mecanismos de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigidos a consensos comunarios, organizaciones y otras formas organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Ralizes y Palenqueras.	60%	20%	13%	13%	25%	15%	A partir del seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - CAFTI se evidencia que el Área responsable presenta tareas con el establecido respecto del indicador y tareas para el segundo trimestre de la vigencia 2024. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 20% y se evidencia un cumplimiento de los 15%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 75%. Evaluación: Cumplimiento 75% para el segundo trimestre de 2024. Este rezago implica un riesgo de cumplimiento. Se evidencia un cumplimiento menor respecto con la meta propuesta. Se recomienda continuar con la ejecución de actividades que se deben realizar.	75,0%	Indicador presenta avance esperado	
	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI			Proyectos de CTeI dirigidos a consensos comunarios, organizaciones y otras formas organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Ralizes y Palenqueras.	Avance en la implementación de los mecanismos de Ciencia, Tecnología e Innovación dirigidos a consensos comunarios, organizaciones y otras formas organizativas de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Ralizes y Palenqueras.	60%	20%	13%	13%	25%	15%	A partir del seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - CAFTI se evidencia que el Área responsable presenta tareas con el establecido respecto del indicador y tareas para el segundo trimestre de la vigencia 2024. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 20% y se evidencia un cumplimiento de los 15%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 75%. Evaluación: Cumplimiento 75% para el segundo trimestre de 2024. Este rezago implica un riesgo de cumplimiento. Se evidencia un cumplimiento menor respecto con la meta propuesta. Se recomienda continuar con la ejecución de actividades que se deben realizar.	75,0%	Indicador presenta avance esperado	
7	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI	I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz Total	Ejes Transversales: 1. Ordenamiento del territorio 2. Seguridad humana y justicia social 3. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6. Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral	Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país	(PE7) Promover y fortalecer procesos de apropiación social del conocimiento y la innovación social en el territorio	Centro de bioeconomía para el Pacífico Colombiano	1	0	0	0%	0%	Con base en el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - CAFTI se evidencia que el Área responsable presenta tareas con el establecido respecto del indicador y tareas para el segundo trimestre de la vigencia 2024. Por lo tanto, se define recomendar al área responsable gestionar las solicitudes pertinentes para ajustar la planeación, asegurando así el cumplimiento adecuado de las aportes previstos para el avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.	Descripción: El reporte en GINA del segundo trimestre de 2024, refleja actividades de diseño, formulación y ajustes de los términos de referencia de la convocatoria para conformar una lista de elegibles para la financiación de proyectos de CTeI para el pueblo negro, afrocolombiano, raliza y palenquero. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento 100% para el segundo trimestre de 2024. Este rezago implica un riesgo de cumplimiento. Se evidencia un cumplimiento menor respecto con la meta propuesta. Se recomienda continuar con la ejecución de actividades que se deben realizar.	100,0%	Indicador presenta avance esperado
	Líder: Viceministerio de Talento y Aprovechamiento del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI	III. Justicia Económica IV. Paz Total	Ejes Transversales: 6. Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral	Reducir las brechas territoriales, étnicas y de género en CTeI	(PE7) Promover y fortalecer procesos de apropiación social del conocimiento y la innovación social en el territorio	Programa de CTeI para la transformación territorial	50	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	El avance obtenido en el segundo trimestre refleja la gestión en la convocatoria 956 de 2024 de la cual se espera tener el banco definitivo de beneficiarios en octubre, lo cual permitirá el cumplimiento adecuado de las metas asociadas a la iniciativa. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. Hay 3 indicadores que no están definidos o la falta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento de 3 indicadores de 0% al 100 y se evidencian 3 indicadores que no se encuentran formulados y tampoco tienen metas definidas. Los indicadores: "Proyecto de I+D+i apoyado para la generación de bioproductos en los ríos TLR 1 a 4", "Patios agroecológicos implementados como iniciativa de CTeI para garantizar el derecho humano a la alimentación" y "Estrategia de apropiación social del conocimiento aplicada con enfoque restaurativo".	No aplica	Indicador presenta avance esperado	
	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI			Patios agroecológicos implementados como iniciativa de CTeI para garantizar el derecho humano a la alimentación	Patios agroecológicos implementados como iniciativa de CTeI para garantizar el derecho humano a la alimentación	1	0	0	0	0%	0%	El avance obtenido en el segundo trimestre refleja la gestión en la convocatoria 956 de 2024 de la cual se espera tener el banco definitivo de beneficiarios en octubre, lo cual permitirá el cumplimiento adecuado de las metas asociadas a la iniciativa. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. Hay 3 indicadores que no están definidos o la falta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento de 3 indicadores de 0% al 100 y se evidencian 3 indicadores que no se encuentran formulados y tampoco tienen metas definidas. Los indicadores: "Proyecto de I+D+i apoyado para la generación de bioproductos en los ríos TLR 1 a 4", "Patios agroecológicos implementados como iniciativa de CTeI para garantizar el derecho humano a la alimentación" y "Estrategia de apropiación social del conocimiento aplicada con enfoque restaurativo".	100,0%	Indicador presenta avance esperado	
	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI			Estrategia de apropiación social del conocimiento aplicada con enfoque restaurativo	Estrategia de apropiación social del conocimiento aplicada con enfoque restaurativo	1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	El avance obtenido en el segundo trimestre refleja la gestión en la convocatoria 956 de 2024 de la cual se espera tener el banco definitivo de beneficiarios en octubre, lo cual permitirá el cumplimiento adecuado de las metas asociadas a la iniciativa. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. Hay 3 indicadores que no están definidos o la falta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento de 3 indicadores de 0% al 100 y se evidencian 3 indicadores que no se encuentran formulados y tampoco tienen metas definidas. Los indicadores: "Proyecto de I+D+i apoyado para la generación de bioproductos en los ríos TLR 1 a 4", "Patios agroecológicos implementados como iniciativa de CTeI para garantizar el derecho humano a la alimentación" y "Estrategia de apropiación social del conocimiento aplicada con enfoque restaurativo".	100,0%	Indicador presenta avance esperado	
	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI			Patios agroecológicos implementados como iniciativa de CTeI para garantizar el derecho humano a la alimentación	Patios agroecológicos implementados como iniciativa de CTeI para garantizar el derecho humano a la alimentación	1	0	0	0	0%	0%	El avance obtenido en el segundo trimestre refleja la gestión en la convocatoria 956 de 2024 de la cual se espera tener el banco definitivo de beneficiarios en octubre, lo cual permitirá el cumplimiento adecuado de las metas asociadas a la iniciativa. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 0%. Hay 3 indicadores que no están definidos o la falta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento de 3 indicadores de 0% al 100 y se evidencian 3 indicadores que no se encuentran formulados y tampoco tienen metas definidas. Los indicadores: "Proyecto de I+D+i apoyado para la generación de bioproductos en los ríos TLR 1 a 4", "Patios agroecológicos implementados como iniciativa de CTeI para garantizar el derecho humano a la alimentación" y "Estrategia de apropiación social del conocimiento aplicada con enfoque restaurativo".	100,0%	Indicador presenta avance esperado	
8	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI	I. Justicia Ambiental II. Justicia Social III. Justicia Económica IV. Paz Total	Ejes Transversales: 1. Ordenamiento del territorio 2. Seguridad humana y justicia social 3. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6. Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral	Adoptar enfoques de políticas públicas de investigación e innovación para resolver grandes desafíos sociales, económicos y ambientales del país	(PE8) Aumentar la cooperación a nivel internacional para consolidar el SNETI	Articulación cooperación internacional	12	1	4	400%	33%	En línea con el seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - CAFTI se evidencia que el Área responsable cumplió con el establecido respecto al indicador y tareas para el segundo trimestre de la vigencia 2024. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 4. 75% y 0%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento 100% para el segundo trimestre de 2024. Este rezago implica un riesgo de cumplimiento. Se evidencia un cumplimiento menor respecto con la meta propuesta. Se recomienda continuar con la ejecución de actividades que se deben realizar.	400,0%	Indicador presenta avance esperado	
	Líder: Dirección de Capacidades y Apropiación del Conocimiento Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI			Fortalecer la gobernanza del SNETI y sus capacidades a través de políticas públicas, planes y programas de CTeI	Fortalecer la gobernanza del SNETI y sus capacidades a través de políticas públicas, planes y programas de CTeI	2	0	0	0%	0%	0%	El avance obtenido en el segundo trimestre refleja la gestión en la convocatoria 956 de 2024 de la cual se espera tener el banco definitivo de beneficiarios en octubre, lo cual permitirá el cumplimiento adecuado de las metas asociadas a la iniciativa. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 4. 75% y 0%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%. Evaluación: Cumplimiento 100% para el segundo trimestre de 2024. Este rezago implica un riesgo de cumplimiento. Se evidencia un cumplimiento menor respecto con la meta propuesta. Se recomienda continuar con la ejecución de actividades que se deben realizar.	100,0%	Indicador presenta avance esperado	
9	Líder: Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI	II. Justicia Social	Ejes Transversales: 3. Convergencia Regional Ejes Transversales: 6. Actores Diferenciales para el Cambio 7. Paz Total e Integral	Gestionar recursos para el SNETI	Índice de desempeño Institucional	Estar entre los 7 Primeros Lugares	No aplica	No aplica	0%	0%	No aplica	Teniendo en cuenta que la periodicidad del indicador y la meta es anual no se tienen recomendaciones para este período de reporte. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de este indicador es anual por lo tanto no aplica para análisis en este reporte, sin embargo se debería evidenciar avance a la falta. Evaluación: Cumplimiento 100% para el segundo trimestre de 2024. Este rezago implica un riesgo de cumplimiento. Se evidencia un cumplimiento menor respecto con la meta propuesta. Se recomienda continuar con la ejecución de actividades que se deben realizar.	No aplica	Si bien es cierto en la actualidad se tiene definido un reporte para este indicador en la vigencia 2024, se considerará generar una recomendación para las próximas programaciones de indicadores anuales, con la necesidad de generación de un reporte de avance cuantitativo de la gestión realizada trimestralmente.	
	Líder: Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional Corresponsables: Dirección de Gestión de Recursos para la CTeI			Estrategia implementada para el cierre de brechas (a mayor certidumbre del desempeño institucional	Estrategia implementada para el cierre de brechas (a mayor certidumbre del desempeño institucional	100%	50%	50%	50%	50%	50%	A partir del seguimiento adelantado por la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional - CAFTI se evidencia que el Área responsable cumple con el establecido respecto al indicador y tareas para el segundo trimestre de la vigencia 2024. Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -La meta del indicador para el segundo trimestre es de 50%. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 50%. Evaluación: Cumplimiento 50% para el segundo trimestre de 2024. Este rezago implica un riesgo de cumplimiento. Se evidencia un cumplimiento menor respecto con la meta propuesta. Se recomienda continuar con la ejecución de actividades que se deben realizar.	100,0%	Indicador presenta avance esperado	

Talento Humano, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora Jurídica	Fortalecer la institucionalidad del ministerio a través de la gestión del talento humano, la calidad y la innovación en la gestión pública	ministerio mediante la implementación, sostenimiento, mejora de requisitos y buenas prácticas en materia de gestión, desempeño y transparencia para generar la confianza y legitimidad en la ciudadanía	Gestión para el cierre de brechas y la mejora continua del desempeño organizacional	Estrategia implementada para generar experiencias de aprendizaje organizacional que incentiven y visibilicen el capital intelectual de la entidad	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100,0%	Indicador presenta avance esperado
<p>El presente informe es un documento de carácter informativo y no constituye un acto administrativo, sino que continúa con el desarrollo organizacional con base en los productos del consultor (Contrato 791 de 2023). Avances en el cumplimiento de la Política de Gestión de Información (Estadística del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Seguimiento a la ejecución presupuestal con evaluación positiva de compromisos y obligaciones. Desarrollo de seguimiento a la Gestión de la Información y sesiones del comité de gestión y desempeño sectorial e institucional.</p> <p>En cuanto a las estrategias para generar experiencias, se crearon los Agentes C4 y los flujos que incentiva la participación y creatividad de los funcionarios y contratistas del Ministerio con tres encuentros de desarrollo de capacidades, relacionados con metodologías de innovación, agilidad, design thinking y service blue print. Finalmente reportan el avance en la creación del micrositio en la intranet donde visualizan los encuentros y los resultados de las entrevistas realizadas para la construcción del mapa de conocimiento, se envían piladoras de innovación y se realizan los retos de innovación internos en la OAPI.</p> <p>Análisis cuantitativo: -La frecuencia de medición de estos indicadores es trimestral. -Las metas de los indicadores para el segundo trimestre son de 50% y se ha cumplido con la meta propuesta. -El cumplimiento reflejado en la plataforma GINA es de un 100%.</p> <p><small>El presente informe es un documento de carácter informativo y no constituye un acto administrativo.</small></p>													

[ORIGINAL FIRMADO]


Elaborado por: Diana Carolina Joven Pineda
 Contratista OCI

[ORIGINAL FIRMADO]

Revisado: Victor Osmar Vergara Torres
 Jefe Oficina OCI

Indicador	Porcentaje
Si cumplió con la meta	75%
Indicador por gestionar	14%
No cumplió con la meta	11%
TOTAL	100%

CONCLUSIONES
Si cumplió con la meta: De 72 indicadores, se evidencian 54 con porcentajes de cumplimiento pertinente. Estos 72 indicadores representan el 75% del total. Para cada indicador se han realizado comentarios en la presente matriz, específicamente en la columna "Análisis de la Oficina de Control Interno".
Indicador por gestionar: De 72 indicadores, se evidencian 10 indicadores sin meta definida y sin medición que equivalen al 14% del total. Se hace necesario definir el comportamiento de tales indicadores para la vigencia.
No cumplió con la meta: De 72 indicadores, se evidencian 8 indicadores con porcentajes de cumplimiento menores a la meta (11% del total).
Conclusión general: De los 72 indicadores evaluados, se encontró un rezago en 18 indicadores que deberían estar en el 100% de cumplimiento.

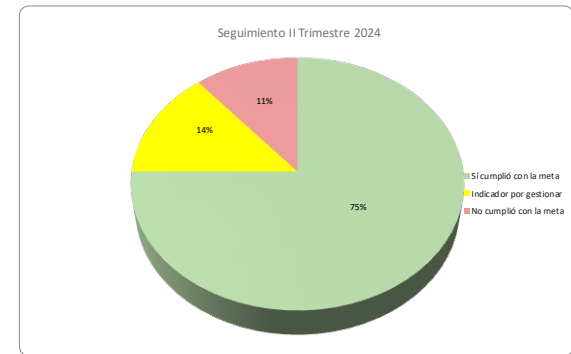

Fecha de elaboración seguimiento 2do trimestre: 24 de septiembre de 2024
